Range NT-3 Location

Located in E½ NE¼ & NE¼ SE¼ Sec. 18, T-4-S, R-3-E, Tippah County, Miss.

On land of Billy Simmons, at right (north of creek) and on land of Reese Stubbs at left (south of creek)

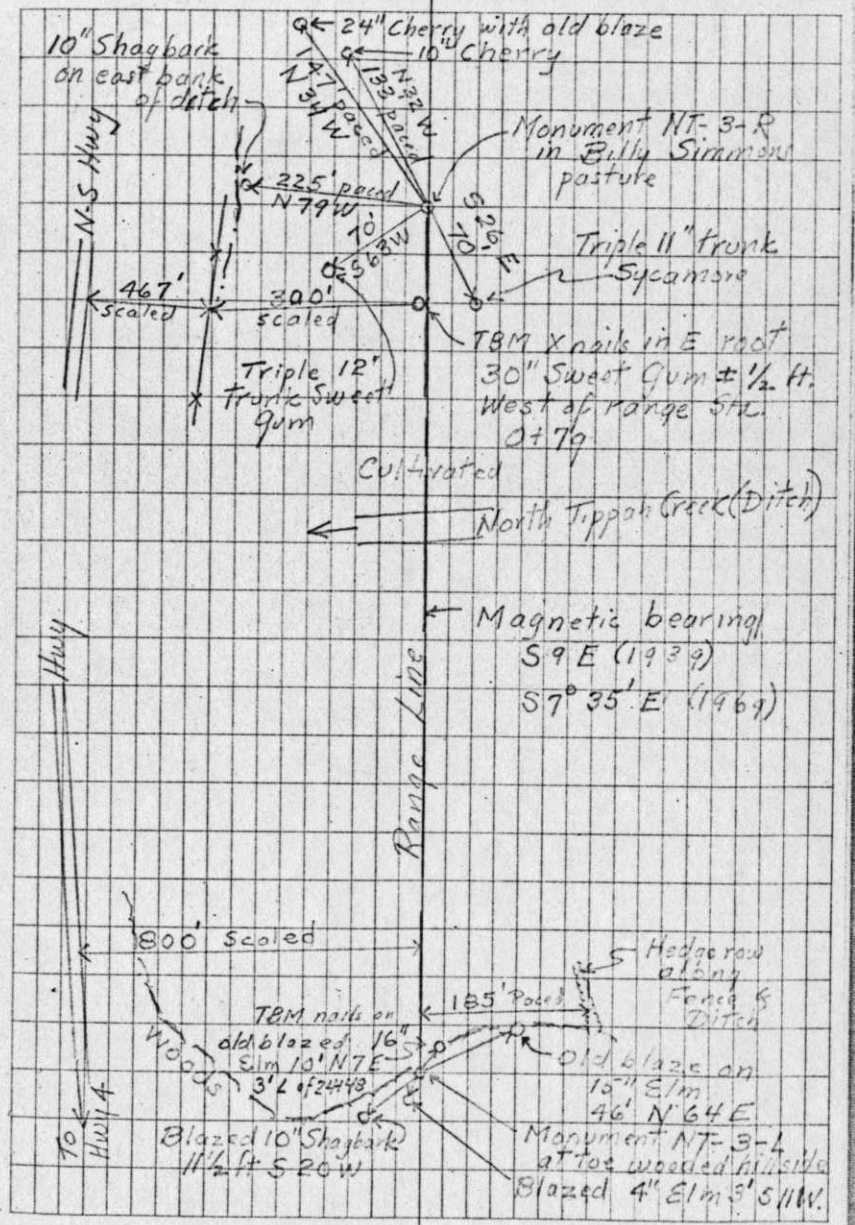

NT-3 2450 ft
R 417.84
L 415.03 415.03

N 9 W
9:15
8:15 5'27
N 8° 21' W

Turner X ch
Dalton
Stanford ϕ
McMahon axe
Hopp m

5/22/69 — NT - 3

Instr at 0+60	1.375	419.31[5]			417.94
Instr at 0+60	3.93	418.84	4.40[5]		414.91
			0.89[5]	417.94[5]	
0+00			1.1	417.7	
20			2.2	416.6	
40			4.4	414.4	
60			4.7	414.1	
78			5.1	413.7	
79					
80					
1+00			6.2	412.6	
04			6.2	412.6	
06			6.5	412.3	
10			5.9	412.9	
20			6.3	412.5	
40			6.3	412.5	
60			6.1	412.7	
80			6.1	412.7	
2+00			6.3	412.5	
20			6.5	412.3	
40			6.6	412.2	
60			6.7	412.1	
80			6.3	412.5	
85			6.2	412.6	

Top Monument NT-3-R Elev. from 1939 survey
TBM X nails in E root 30" sw Gum 1'R at 0+79
Top Mon. NT-3-R
Grd at Mon. in pasture on hillside

H.I.

Grd at NE side TBM tree
± ½ ft. U.S. from TBM in root of 30" Sweet Gum
Mon. root 1' U.S from TBM tree

F/L leave pasture

		418.84			
2+87			6.9	411.9 ✓	
90			7.3	411.5 ✓	
92			6.5	412.3 ✓	
3+00			6.4	412.4 ✓	
20			6.3	412.5 ✓	
40			6.3	412.5 ✓	
60			6.4	412.4 ✓	
80			6.4	412.4 ✓	
4+00			6.5	412.3 ✓	
Instr. at 6+20	4.61	417.26 ✓	6.19		412.65 ✓
20			5.1	412.2 ✓	
46			4.8	412.5 ✓	
46			4.9	412.4 ✓	
60			5.0	412.3 ✓	
80			4.7	412.6 ✓	
5+00			4.5	412.8 ✓	
20			4.4	412.9 ✓	
40			4.4	412.9 ✓	
60			4.3	413.0 ✓	
80			4.3	413.0 ✓	
6+00			4.2	413.1 ✓	
20			4.5	412.8 ✓	
40			5.2	412.1 ✓	
66			5.6	411.7 ✓	
80			5.8	411.5 ✓	

Enter cotton

TP on axe at 4+00

		417.26			
6+94			5.6	411.7 ✓	
7+00			5.4	411.9 ✓	
20			5.4	411.9 ✓	
40			5.6	411.7 ✓	
56			5.1	412.2 ✓	
60			5.1	412.2 ✓	
80			4.0	413.3 ✓	
8+00			3.8	413.5 ✓	
11			3.6	413.7 ✓	
14			5.4	411.9 ✓	
15			5.5	411.8 ✓	
8+15			5.29		411.97 ✓
8+15	3.72	416.69 ✓			
8+17.5			4.1	411.6 ✓	
19			6.5	409.2 ✓	
21			9.0	406.7 ✓	
32			13.5	402.2 ✓	
38			15.8	399.9 ✓	
40			16.0	399.7 ✓	
50			16.1	399.6 ✓	
65			16.2	399.5 ✓	
66			15.8	399.9 ✓	
69			13.6	402.1 ✓	
70			10.9	404.8 ✓	

On spoil spread from creek bank

" " " " " "

Top spoil bank

Nat grd

Top hub at 8+15

B.S. Top hub at 8+15 Sta. at 9+65 ✓ — Dalton, Champion, Stanford, Hopp — 5/27

Top R. Bk. N. Tippah ditch

water's edge and level

0.2 water

water's edge and level

		(415.7)		
8+72			8.0	407.7
73			5.7	410.0
76			3.5	412.2
80			3.4	412.3
85			3.8	411.9
93.5			3.4	412.3
9+00			3.4	412.3
14			1.4	414.3
20			1.6	414.1
40			3.4	412.3
60			3.6	412.1
80			3.7	412.0
10+00			3.6	412.1
20			3.8	411.9
40			3.8	411.9
60			4.0	411.7
80			4.1	411.6
11+00			4.1	411.6
20			4.2	411.5
40			4.2	411.5
60			4.2	411.5
80			4.4	411.3
12+00			4.8	410.9
20			4.9	410.8
40			5.4	410.3

7/17 Check chainage

Toe bank N. Tippah ditch 8+78

On spoil

On spoil

Toe spoil 9+01

Top spoil 9+17

Top spoil 9+22

Toe spoil 9+38

		416.69			
12+60			5.0	410.7	
80			4.6	411.1	
13+00			4.4	411.3	
Instr at 15+80	4.29	415.82	4.16		411.53
20			4.5	411.3	
40			4.4	411.4	
60			4.4	411.4	
80			4.2	411.6	
14+00			3.8	412.0	
16			2.9	412.9	
18			5.2	410.6	
20			6.6	409.2	
23			7.6	408.2	
25			7.8	408.0	
27			6.0	409.8	
27			4.8	411.0	
30			3.4	412.4	
40			3.7	412.1	
60			4.8	411.0	
80			5.1	410.7	
15+00			4.7	411.1	
20			4.1	411.7	
40			4.0	411.8	
60			4.0	411.8	
80			4.0	411.8	

TP on axe at 13+00

Lv. cult. field, enter brush.
Top RBk ditch.

Top L Bk ditch
Lv. brush
Idle field

HI

		416.82				
16+06			4.2	411.6		
20			4.3	411.5		
40			4.2	411.6		
60			4.2	411.6		
80			4.4	411.4		
17+00			4.3	411.5		
20			4.3	411.5		
40			4.3	411.5		
60			4.0	411.8		
80			4.1	411.7		
18+00			4.4	411.4		
20			4.5	411.3		
23			5.1	410.7		Dead furrow depression
27			4.6	411.2		
40			4.7	411.1		
60			4.7	411.1		
80			4.7	411.1		
19+00			4.2	411.6		
Instrat 21+70	4.01	416.88	3.95		412.87	TP on axe at 19+00
20			4.4	411.5		
40			4.2	411.7		
60			3.9	412.0		
64			4.2	411.7		
67			3.3	412.6		Hedge row
71			3.5	412.4		F/Line

		(415.9)			
19+80			4.1	411.8	
20+00			4.4	411.5	
20			4.3	411.6	
40			4.4	411.5	
60			5.0	410.9	
80			4.9	411.0	
21+00			5.0	410.9	
05			4.8	411.1	
10			4.1	411.8	Hedgerow
13			5.4	410.5	
16			5.7	410.2	Ditch
18			4.5	411.4	F/L
20			4.6	411.3	
43			4.6	411.3	
60			4.3	411.6	
80			4.5	411.4	
22+00			4.6	411.3	
20			4.3	411.6	
40			4.1	411.8	
60			3.9	412.0	
80			4.0	411.9	
23+00			4.0	411.9	
20			4.0	411.9	
40			4.1	411.8	
60			3.9	412.0	

		418.88			
23+80			3.8	412.1 ✓	
24+00			3.2	412.7 ✓	
+05			3.8	412.1 ✓	
09			2.9	413.0 ✓	
20			3.4	412.5 ✓	
28			3.4	412.5 ✓	
40			2.9	413.0 ✓	
48			2.3	413.6 ✓	
57.9			1.0	414.9 ✓	
24+57.9			0.81		418.07 ✓
			1.59		415.29 ✓
	1.77	416.06 ✓			
				0.99	418.07 ✓
					415.03
					+0.04

3'DS from TBM nail on 16" Elm w/1939 blaze grd at Mon. NT-3-L

Top Mon NT-3-L

TBM X nails in W root 16" Elm, 10 ft NE from Monument.

3.5 on TBM

Top Mon

1939 survey, adj.

Closure
